
	<b>C.E.T. DE CRONFESTU</b>	
	<b>Mesures piézométriques</b>	
	Type de fiche : Géologie et hydrogéologie	
	Actualisation : le 3 février 2011	
	<a href="http://www.issep.be">www.issep.be</a>	

**Thème : Relevés piézométriques dans les piézomètres de surveillance du C.E.T. de Cronfestu**

Piézo.	Z <sub>sommet</sub>	Z <sub>fond</sub>	Altitudes piézométriques mesurées								
			mars-95	sept.-98	mars-99	oct.-99	nov.-99	juin-00	mars-01	mai-01	oct.-01
PZ1	108,37	72,37	89,49	87,65	89,41	87,92		88,09	88,60		88,54
PZ2	111,91	76,91	83,18	81,25	82,77	82,32		81,87	82,57		83,35
PZ3	95,04	63,04	73,91	70,17	73,76	72,90		71,76	73,02		74,88
PZ4	89,32	57,32	73,22				72,27	71,91	73,00		74,81
PZ5	96,62	64,62	73,42	70,71	73,56	73,39		72,23		75,35	75,10
PZ6	90,52	55,52	72,68	69,79	72,74	72,55		71,35	72,48		74,24
PZ7	82,39	64,39	73,22	70,45	73,20	73,12		72,00	73,03		74,90
PZ8	86,16	56,16	73,12	70,44	73,30	73,15		71,97	73,07		74,93
PZ9	88,78	58,78	71,12	Ouvrage détruit							
PZ10	103,62	68,62	72,25	68,69	Ouvrage obstrué			69,53	71,23	obstrué	72,68


  

Piézo.	Z <sub>sommet</sub>	Z <sub>fond</sub>	Altitudes piézométriques mesurées								
			sept.-02	mars-03	sept.-03	mars-04	sept.-04	mars-05	mars-06	oct.-06	janv-07
PZ1	108,37	72,37	88,47	89,14	87,77	87,90	87,17	87,62		87,57	87,82
PZ2	111,91	76,91	83,85	84,00	82,25	81,70	81,15	81,25	81,20	81,55	81,57
PZ3	95,04	63,04	75,71	75,64	72,47	70,86	69,36	69,36	69,26	70,31	
PZ4	89,32	57,32	75,76	75,44	72,92	71,24	69,79	69,79	69,77	70,79	70,76
PZ5	96,62	64,62	76,12	75,78	73,27	71,57	70,19	70,19	70,11	71,11	70,08
PZ6	90,52	55,52	75,19	74,91	72,39	70,65	69,24	69,14	69,04	70,14	70,14
PZ7	82,39	64,39	75,73	75,42	73,00	71,32	69,90	69,85	69,70	70,78	70,78
PZ8	86,16	56,16	75,77	75,52	73,07	71,30	69,92	69,92	69,72	70,79	70,77

Piézo.	Z <sub>sommet</sub>	Z <sub>fond</sub>	Altitudes piézométriques mesurées								
			mai-07	oct-07	avr-08	nov-08	avr-09	sept.-09			
PZ1	108,37	72,37	88,02	87,47	88,52	87,87	88,22	87,57			
PZ2	111,91	76,91	81,85	81,55	82,33	82,05	82,35	82,35			
PZ3	95,04	63,04	70,86	70,66	72,36	72,16	72,36	70,76			
PZ4	89,32	57,32	71,29	Ouvrage obstrué							
PZ5	96,62	64,62	Ouvrage obstrué								
PZ6	90,52	55,52	70,64	70,44	71,89	71,84	72,09	71,14			
PZ7	82,39	64,39	71,30	71,20	72,45	72,45	72,40	71,75			
PZ8	86,16	56,16	71,32	71,27	72,52	72,52	72,72	71,77			

Le graphique ci-dessous reprend les mesures d'autocontrôle réalisées par IDEA entre septembre 1998 et septembre 2009.

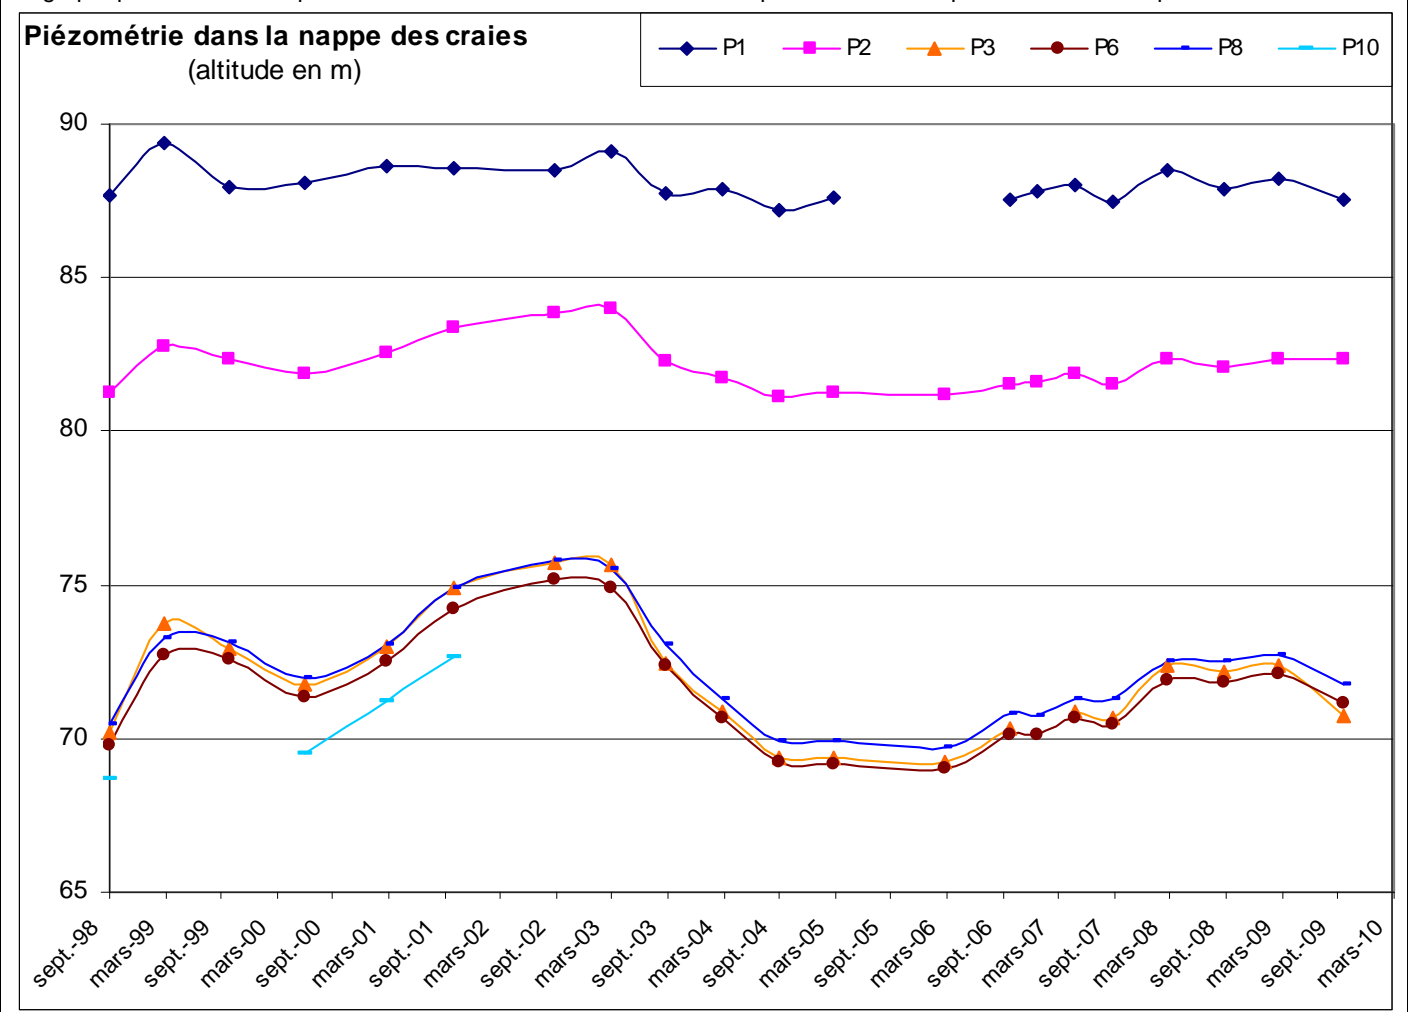

Les niveaux de nappe mesurés dans les piézomètres P4, P5 et P7 suivent de manière fidèle les profils des P5, P6 et P8.

REFERENCES

Rapports et mesures d'autocontrôle IDEA.
